华电岚县光伏发电项目 220kV 送出工程 竣工环境保护验收调查表

建设单位: <u>以县华电新能源有限责任公司</u>

调查单位: 山西鑫瑞嘉源环保科技有限公

编制日期:二零二五年十一月

建设单位法人代表:周波调查单位法人代表:白宏

报告编写负责人: 耿会会

主要编制人员情况					
姓名 职称 职责 签名					
耿会会	工程师	报告编写及现场调查	联考学		

建设单位: 岚县华电新能源有限责任公司 调查单位: 山西鑫瑞嘉原科

电话: 15535972388

电话: 13754862468

传真:/

传真: /

邮编: 035200

邮编: 030031

地址: 山西省吕梁市岚县经济技术开发区 地址: 太原市小店区晋阳街 68 号海棠国 特造产业园办公楼 1007 室 际大厦 14 层 15 层

一、项目总体情况

建		华电岚县光伏发。	中型日 22012/25	上山 丁		
建设项目名称		, ., ., ., ., .,				
建设单位	周波		能源有限责任公		- 1 1	
法人代表			联系人 毛树理 毛树理 无形发区铸造产业园办公楼 1007 室			
通讯地址						
联系电话	15535972388	传真		邮政编码	035200	
建设地点		西省吕梁市岚县			· 本山 - 7 和	
项目建设性质 环接影响	新建√改扩建 技	支改 行	f业类别	161	ì变电工程	
环境影响 报告表名称	《华电岚县	县光伏发电项目 2	20kV 送出工程	环境影响报告	表》	
环境影响 评价单位		山西同盛科技有限公司				
初步设计单位		山西明升电	力设计有限公	司		
环境影响评价 审批部门	吕梁市行政审批 服务管理局	文号	吕审批发函 [2025]244 号	时间	2025.6.24	
建设项目核准 部门	吕梁市行政审批 服务管理局	文号	吕审批发 [2025]154 号	时间	2025.4.22	
初步设计审批 部门	/	文号	/	时间	/	
环境保护设施		山西新泊	 半科技有限公司			
设计单位 环境保护设施						
小児保护 反應 施工单位		山西新洋	牟科技有限公司			
环境保护设施 监测单位		山西志源生态	环境科技有限	公司		
投资总概算	5486	环境保护投资	83.26	环境保护	1.52%	
(万元)	3400	(万元)	65.20	投资占总	1.3270	
实际总投资 (万元)	5800	环境保护投资 (万元)	86	投资比例	1.47%	
环评阶段项目 建设内容	(1)新建 220kV 送 路全长 13.66km,其 路 13.04km,单位 0.62km;(2)拆除 铜鼓山光伏 220kV 和 032 号塔基及其之 0.4kr	出线路工程,线中双回路架空线 回路架空线路 与旭东升风电~ 线路π接处 031 之间的架空线路	项目开工日期 2025.6.20			
项目实际建设 内容	(1)建成 220kV 送路全长 13.66km,其路 13.04km,单位 0.62km; (2)已对鼓山光伏 220kV 线 032 号塔基及其之间线路进行	中双回路架空线 回路架空线路 旭东升风电~铜 路π接处 031 和 同的 0.4km 架空	环境保护设施 投入调试日期 2025.9		2025.9.20	
项目建设 过程简述	华电岚县光伏为村镇、上明乡。201 [2025]154 号文同意 成本工程环评报告表 批发函[2025]244 号	文电项目 220kV 运 25 年 4 月 22 日, 本工程建设。2025 表。2025 年 6 月 文对本工程环境 年 6 月 26 日开口	吕梁市行政审 25年6月,山下 24日,吕梁市行 影响报告表予以	日批服务管理 西同盛科技有 行政审批服务 批复。	局以吕审批发 限公司编制完 管理局以吕审	

二、调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

本次验收调查范围与环境影响评价范围一致。根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T394-2007)等,本次验收调查报告确定的调查范围如下表 2-1。

表 2-1 验收调查范围一览表

调查范围

调査对象	调査项目	调査范围
	工频电场、工频磁场	架空线路边导线地面投影外两侧各 40m 范围
输电线路	噪声	架空线路边导线地面投影外两侧各 40m 范围
	生态环境	边导线地面投影外两侧各 300m 带状区域 范围,面积为 812.15hm ² 。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)4.7,本工程竣工环境保护验收的主要环境监测因子见表 2-2。

表 2-2 竣工验收调查因子一览表

环境监测 因子

调查对象	环境监测因子	监测指标及单位		
	工频电场	工频电场强度,V/m		
输电线路	工频磁场	工频磁感应强度,μT		
	噪声	昼间、夜间等效声级, Leq, dB(A)		

环境敏感 目标

经现场调查,本工程送出线路调查范围内无声环境保护目标;无电磁环境保护目标;水环境保护目标为上明河和黄签河。本工程不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年)中输变电工程应关注的生态敏感区域。实际与环评阶段确定的环境敏感目标一致,无变化。

- 1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容:
- 2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况;
- 3、环境敏感目标基本情况及变动情况;
- 4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度的执行情况;

调查重点

- 5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况;
 - 6、环境质量和环境监测因子达标情况;
 - 7、建设项目环境保护投资落实情况;
 - 8、工程施工期和试运行期存在的环境问题。

三、验收执行标准

	本次竣工环保验收调查与环评阶段的执行标准一致:以《电磁环境控制限					
电磁环境	值》(GB8702-2014)表1中控制限值为排放限值,即送出线路下的旱地、园					
标准	地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,电场强度控制限值为 10kV/m,					
	工频磁场强度控制限值为 100 µ T。					
声环境	根据本工程的环境影响报告表及批复文件要求,本工程竣工环保验收声环境					
标准	执行标准为:《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 1 类标准要求。					
	1、《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订,2015年1					
	 月 1 日起施行);					
	2、《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正);					
	3、《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修正);					
	4、《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日起施行);					
	5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订,					
	2020 年 9 月 1 日起施行);					
	6、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令·第 682 号, 2016 年 6 月 21 日通过, 2017 年 10 月 1 日起施行):					
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
±6.61 1→50.	7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号;					
其他标准	8、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020);					
和要求	9、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T394-2007);					
	10、《关于印发<输变电建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(环办					
	辐射 [2016] 84 号);					
	11、《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020);					
	12、《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013);					
	13、吕梁市行政审批服务管理局《关于华电岚县光伏发电项目送出线路项					
	目核准的批复》(吕审批发[2025]154号, 2025年4月22日);					
	14、《华电岚县光伏发电项目 220kV 送出工程环境影响报告表》(山西同					
	盛科技有限公司,2025年6月);					
	15、《关于华电岚县光伏发电项目 220kV 送出工程环境影响报告表的批复》					
	(吕审批发[2025]244 号, 2025 年 6 月 24 日)。					

四、建设项目概况

项目建设地点:

本工程起于华电岚县光伏发电项目 220kV 升压站,接 220kV 旭东升风电项目~铜鼓山光 伏项目 220kV 线路,通过铜鼓山光伏~袁家村站 220kV 线路送出。新建 220kV 架空线路总长 13.66km,其中双回线路 13.04km,单回线路 0.62km。线路位于吕梁市岚县岚城镇、东村镇和上明乡。地理位置示意图见附图 1。

主要建设内容及规模:

(1) 220kV 送出工程的线路工程:

本工程从华电岚县光伏发电项目 220kV 升压站架空出线,向西架空跨越 220kV 第岚线,继续向西至前黄签村西南角,向西北至翁子村西南角,继续向西北跨越 110kV 高岚线后至 π接入旭东升风电~铜鼓山光伏 220kV 线路,通过铜鼓山光伏~袁家村站 220kV 线路送出。建成 13.04km 双回路架空线路、0.62km 单回路架空线路,线路路径见附图 2。

(2) 拆除工程

拆除与旭东升风电~铜鼓山光伏 220kV 线路 π 接处 031 和 032 号塔基及其之间的架空线路 0.4 km。

	衣 4-1 以日土安建议内谷衣							
	C程组成	环评阶段	验收阶段	变化情况				
	电压等级	220kV	220kV	与环评一致				
	输送容量	80MVA	80MVA	与环评一致				
	额定电流	209.9A	209.9A	与环评一致				
	地理位置	上明乡、东村镇和岚城镇	上明乡、东村镇和岚城镇	与环评一致				
	架设方式	架空	架空	与环评一致				
主体工程	线路长度	架空线路长 13.66km, 其中同塔双回架空线路 13.04km,单回路架空线 路 0.62m	架空线路长 13.66km, 其中 同塔 (SG1~SG32) 双回架空 线路 13.04km, 单回路 (G1~G2) 架空线路 0.62m	与环评一致				
	导线型号和 分裂间距	2×JL/GIA-300/40 型钢 芯铝绞线,双分裂,分 裂间距 400mm	2×JL/GIA-300/40 型钢芯铝 绞线,双分裂,分裂间距 400mm	与环评一致				
	杆塔形式及 数量	34 基,其中:双回直线 塔 24 基,双回路转角塔 8 基,单回转角塔 2 基	34 基, 其中: 双回直线塔 24 基,双回路转角塔 8 基(SG1、 SG9、SG12、SG15、SG18、 SG20、SG26、SG32),单 回转角塔 2 基(G1~G2)	与环评一致				
	塔基永久 占地面积	4565m ²	4565m ² (4345m ² 为基本农 田),占地类型为灌木林地、 旱地、其他草地	与环评一致				
辅助工程		用于临时堆置施工材料、器具和临时倒运土方等。布置于塔基永久占地四周,采用临时租赁的形式,施工占用期间不进行土建施工作业,占地面积9393m²	共 34 处,均位于各塔基永久 占地四周,占地面积共计 9393m²。施工区施工期间不 进行土建施工作业,主要用 于施工材料、器具的临时堆 置,并作为倒运土方的临时 用地	与环评一致				

表 4-1 项目主要建设内容表

	牵张场	用于布设牵引机、张力机等大型展放线设备,同时临时堆放各类施工线型材料。本项目设置6处牵张场地,共占地3350m ²	共6处,包括3个牵引场和3个张力场,共3350m²。主要用于牵引机、张力机等大型展放线设备的布设,同时作为施工线型材料的临时堆放场地	与环评一致
	跨越施工区	跨越施工场地 14 处,占地面积 1680m²。跨越场地采用临时租赁的形式,施工占用期间不进行土建施工作业	跨越施工场地采用临时租赁的形式,共设14处,占地面积共1680m²,施工期间不进行土建施工作业	与环评一致
	施工道路	尽量利用现有道路,新建临时施工便道 940m, 路宽 3.5m,占地面积 3290m ²	利用现有道路,新建临时施工便道 940m,路宽 3.5m,占地面积 3290m²(1729m²为永久基本农田),占地类型为旱地、其他草地,已进行植被恢复(种植油松或恢复原有功能)	与环评一致
	施工营地	施工营地位于 SG17 杆 塔附近,G337 国道旁, 为租用加油站现有建 筑,不新建	施工营地位于 SG17 杆塔附近, G337 国道旁, 施工人员租赁附近村庄民房	与环评一致
	生态	工程措施主要包括:表 土剥离、土地整治、截 排水设施等;植物措施 包括:撒播草籽、种植 灌木等; 临时措施包括:彩条布、 临时推土采取拦挡及 流 油等措施 池等措施	施大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	基本按照环评要求落实
环保 工程		施工现场设置围挡,使 用预拌混凝土;运输车 辆密闭、包扎、覆盖、 限制车速;建筑垃圾在 施工期间应当及时清 运;施工结束后,立即 进行空地硬化。	施工时使用预拌混凝土;施工助费用预拌混凝土;施高,以当地三轮车进行运输,运输、运动时进行运输,运输时进行苦盖,低速行驶的时进行苦盖,低速行驶的附低级证物料不遗物的,保证物料不遗物,以当地三轮车进行运输,实力,以降低还物料不遗的,保证物料不遗的,是实立场处置场处置。	基本按照环评要求落实
	废水	施工场地周围的拦挡, 尽量避免雨季开挖作 业;设置简易排水系统, 并设置简易沉砂池,使 产生的施工废水经沉淀 处理后回用,不外排	雨季时不进行作业,散装材料加盖篷布,防止雨水冲刷进入环境,施工结束后及时清理施工迹地,减少水土流失;在工场地设置沉淀池,产生的废水经收集沉淀后回用于场地洒水降尘,不外排。	基本按照环评要求落实

	固废		产生的建筑垃圾及时运至指定的建筑垃圾处置场处置; 施工工人生活垃圾及时清运 至环卫部门指定的地点,交 由环卫部门处理,做到建筑 垃圾和生活垃圾分类收集。	基本按照环评要求落实
			施安量。 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	基本按照环评要求落实
抄	斥除工程	拆除与旭东升风电~铜鼓山光伏 220kV 线路 π接处 031 号和 032 号塔基及其之间的架空线路 0.4km	已严格按照拆除方案拆除与 旭东升风电~铜鼓山光伏 220kV线路π接处031号和 032号塔基及其之间的架空 线路,并对拆除线路产生的 塔材、导线、金具等物料统 一交由电力公司部门集中处 置,现场无遗留,已对占地 进行植被恢复;并新建塔基 G1和G2	基本按照环评 要求落实

建设项目占地及总平面布置、输电线路路径(附总平面布置、输电线路路径示意图):

1、工程占地情况

工程总占地面积 22015m², 其中永久占地 4565m², 临时占地 17450m², 永久占地为塔 基处用地,临时占地为塔基处施工临时用地、跨越处施工场地、牵张场及施工便道等。工程 占地面积及类型见表 4-2。

表 4-2 工程占地情况一览表 | | | 永久占地

序	项目	工程概况	永久占地		临时占地		变化
号	坝日	上往桃儿	面积(m²)	占地类型	面积 (m²)	占地类型	情况
1	塔基区	34 基,其中双回直线 塔 24 基,双回路转 角塔 8 基,单回转角 塔 2 基	4565 (4345 m ² 为基 本农田)	灌木林地、 旱地、其他 草地	/	/	未变化
2	塔基 施工区	用于临时堆置施工材料、器具和临时倒运 土方等。布置于塔基 永久占地四周,采用 临时租赁的形式	/	/	9130 (8690m² 为基本农 田)	灌木林地、 旱地、其他 草地	未变化

3	牵张场	6 处,用于布设牵引 机、张力机等大型 展放线设备,同时 临时堆放各类施工 线型材料	/	/	3350 (2950m² 为基本农 田)	旱地、其他 草地	未变化
4	施工便道	新建临时施工便道 940m,路宽3.5m	/	/	3290 (1729m² 为基本农 田)	旱地、其他 草地	未变化
5	跨越施工场地	14 处(其中跨越公路的设置 8 处,跨越电力线路的设置 6 处,每处占地面积约 120m²),采用临时租赁的形式,施工占用期间不进行土建施工作业	/	/	1680	旱地	未变化
6	施工营地	位于 SG17 杆塔附 近,G337 国道旁为 租用加油站现有建 筑,不新建	/	/	/	/	未变化
		合计	4565	/	17450	/	未变化

2、输电线路路径

本线路从华电岚县光伏发电项目220kV升压站架空出线,向西架空跨越220kV第岚线,继续向西至前黄签村西南角,向西北至翁子村东南角继续向西北跨越110kV高岚线后至接入旭东升风电~铜鼓山光伏220kV线路通过铜鼓山光伏~袁家村站220kV线路送出。

该线路总长13.66km,其中双回路架空线路13.04km,单回路架空线路0.62km,线路路径见附图2。全线使用杆塔34基,其中双回直线塔24基,双回路转角塔8基,单回转角塔2基。

本工程线路环评规模与验收规模对比情况见表4-3, 塔基位置及数量、占地情况与验收 对比情况见表4-4, 杆塔对比情况见表4-5, 主要交叉跨越情况见表4-6。

序号	指标名称	环评设计	实际建设	变化情况
1	回路数	双回路与单回路	双回路(SG1-SG32)、 单回路(G1-G2)	未变化
2	路径长度	13.66km	13.66km	未变化
3	导线类型	JL/G1A-300/40	JL/G1A-300/40	未变化
4	全线塔基	34 基	34 基	未变化

表 4-3 工程线路环评规模与验收规模对比情况一览表

		表 4-4	塔基位置及	及数量 <i>、</i> 占均	也情况与验收	对比情况一	览表	
r	塔基		环评设计			实际建设		亦ル桂
序号	編号	坐	标	占地类型	坐	标	占地类型	一 变化情 况
	-7m J	经度	纬度	口地失空	经度	纬度	口地失空	
1	SG1	111°38′48.665″	38°24′19.889″		111°38′48.665″	38°24′19.889″	灌木林地	未变化
2	SG2	111°38′34.606″	38°24′4.436″		111°38′34.606″	38°24'4.436"	基本农田	未变化
3	SG3	111°38′17.839″	38°23′46.005″		111°38′17.839″	38°23′46.005″	基本农田	未变化
4	SG4	111°38′8.750″	38°23′36.011″		111°38′8.750″	38°23′36.011″	基本农田	未变化
5	SG5	111°37′52.093″	38°23′17.695″		111°37′52.093″	38°23′17.695″	基本农田	未变化
6	SG6	111°37′43.059″	38°23′7.760″		111°37′43.059″	38°23′7.760″	基本农田	未变化
7	SG7	111°37′31.011″	38°22′54.508″		111°37′31.011″	38°22′54.508″	基本农田	未变化
8	SG8	111°37′24.127″	38°22′46.936″		111°37′24.127″	38°22′46.936″	基本农田	未变化
9	SG9	111°37′17.080″	38°22′39.183″		111°37′17.080″	38°22′39.183″	基本农田	未变化
10	SG10	111°37′6.356″	38°22′31.244″		111°37′6.356″	38°22′31.244″	基本农田	未变化
11	SG11	111°36′43.523″	38°22′14.335″		111°36′43.523″	38°22′14.335″	基本农田	未变化
12	SG12	111°36′28.188″	38°22′2.976″		111°36′28.188″	38°22′2.976″	基本农田	未变化
13	SG13	111°36′17.894″	38°21′54.210″		111°36′17.894″	38°21′54.210″	其他草地	未变化
14	SG14	111°36′5.972″	38°21′44.057″		111°36′5.972″	38°21′44.057″	基本农田	未变化
15	SG15	111°35′50.339″	38°21′30.741″		111°35′50.339″	38°21′30.741″	基本农田	未变化
16	SG16	111°35′41.818″	38°21′23.481″		111°35′41.818″	38°21′23.481″	基本农田	未变化
17	SG17	111°35′35.192″	38°21′17.836″	灌木林地、	111°35′35.192″	38°21′17.836″	基本农田	未变化
18	SG18	111°35′28.433″	38°21′12.078″	早地、其他 草地	111°35′28.433″	38°21′12.078″	基本农田	未变化
19	SG19	111°35′16.637″	38°21′2.027″	72	111°35′16.637″	38°21′2.027″	基本农田	未变化
20	SG20	111°35′4.090″	38°20′51.335″		111°35′4.090″	38°20′51.335″	基本农田	未变化
21	SG21	111°34′54.341″	38°20′51.693″		111°34′54.341″	38°20′51.693″	基本农田	未变化
22	SG22	111°34′39.539″	38°20′52.236″		111°34′39.539″	38°20′52.236″	基本农田	未变化
23	SG23	111°34′21.275″	38°20′52.905″		111°34′21.275″	38°20′52.905″	基本农田	未变化
24	SG24	111°34′3.833″	38°20′53.544″		111°34′3.833″	38°20′53.544″	基本农田	未变化
25	SG25	111°33′40.179″	38°20′54.408″		111°33′40.179″	38°20′54.408″	基本农田	未变化
26	SG26	111°33′28.167″	38°20′54.847″		111°33′28.167″	38°20′54.847″	基本农田	未变化
27	SG27	111°33′10.359″	38°20′55.497″		111°33′10.359″	38°20′55.497″	基本农田	未变化
28	SG28	111°32′53.745″	38°20′56.102″		111°32′53.745″	38°20′56.102″	基本农田	未变化
29	SG29	111°32′36.849″	38°20′56.717″		111°32′36.849″	38°20′56.717″	基本农田	未变化
30	SG30	111°32′27.629″	38°20′49.166″		111°32′27.629″	38°20′49.166″	基本农田	未变化
31	SG31	111°32′13.008″	38°20′37.191″		111°32′13.008″	38°20′37.191″	基本农田	未变化
32	SG32	111°32′7.976″	38°20′33.069″		111°32′7.976″	38°20′33.069″	基本农田	未变化
33	G1	111°31′54.842″	38°20′30.340″		111°31′54.842″	38°20′30.340″	基本农田	未变化
34	G2	111°32′8.487″	38°20′23.650″		111°32′8.487″	38°20′23.650″	基本农田	未变化

表 4-5 杆塔对比情况一览表

序		环评设计			实际建设		变化
号	名称	塔型	数量 (基)	名称	名称		情况
1	单回路 转角塔	220-GD22D-DJ	2	单回路 转角塔	220-GD22D-DJ	2	未变化
2	双回路	220-GD22S-DJ	2	双回路	220-GD22S-DJ	2	未变化
3		220-GD22S-J1	4	双回 ^路 转角塔	220-GD22S-J1	4	未变化
4	村用培	220-GD22S-J3	2		220-GD22S-J3	2	未变化
5		220-GC22S-Z2	6		220-GC22S-Z2	6	未变化
6	고 I I I IV	220-GC22S-Z3	8	切同晚	220-GC22S-Z3	8	未变化
7	双回路	220-GC22S-ZC3	4	双回路 直线塔	220-GC22S-ZC3	4	未变化
8	且线增	220-GC22S-ZC4	4	且级增	220-GC22S-ZC4	4	未变化
9		220-GC22S-ZK	2		220-GC22S-ZK	2	未变化
合 计	/	/	34	/	/	34	未变化

表 4-6 本工程主要交叉跨越情况一览表

序号	跨越对象区域	跨越次数	验收调查建设内容	变化情况
1	居民区	/	送出线路未跨越民宅, 不涉及	未变化
2	非居民区	/	自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、森林公园等需特殊保护的地区,无珍稀动植物栖息地或特殊生态系统、天然林等生态敏感与脆弱区。	未变化
3	337 国道黄榆线	1	SG16-SG17 跨越 1 次	未变化
4	220kV 线路	1	SG7-SG8 跨越 1 次	未变化
5	110kV 线路	1	SG29-SG30 跨越 1 次	未变化
6	上明河	1	SG18-SG19 跨越 1 次	未变化
7	黄签河	1	SG9-SG10 跨越 1 次	未变化

建设项目环境保护投资:

本工程实际总投资 5800 万元,其中环保投资 86 万元,占总投资的 1.47%。环保投资情况见表 4-7。

表 4-7 本工程环保投资情况一览表

序号	项目	具体内容	投资额(万元)	占比(%)
1	水土保持	塔基施工区、牵张场跨越施工区等植被 恢复、土地整治等水土保持措施	60	1.03
2	水环境	施工期施工废水处置	2	0.03
3	固废处置及 利用	施工期弃土弃渣清运	3	0.05
4	扬尘	施工期设置临时围挡的建设费以及道 路洒水抑尘等费用	10	0.17
5	声环境	选用低噪声设备等	5	0.09
6	环境管理	环境管理及环境监测费用	6	0.10
		86	1.47	

建设项目变动情况及变动原因:

根据《关于印发<输变电建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(环办辐射[2016]84号),对照环评报告与现场实际建设情况,本工程发生的变动如下:

表 4-8 本工程与"环办辐射[2016]84号"对比分析一览表

序号	变动清单	环评及批复要求	实际建设情况	变动情况	是否属于重 大变动
1	电压等级升高	220kV	220kV	无	否
2	主变压器、换流 变压器、高压电 抗器等主要设 备总数量增加 超过原数量的 30%	本工程为光伏发 电的送出线路, 不涉及主变压 器、换流变压器、 高压电抗器等主 要设备	本工程为光伏发 电的送出线路, 不涉及主变压 器、换流变压器、 高压电抗器等主 要设备	无	否
3	输电线路路径 长度增加超过 原路径长度的 30%	新建 220kV 送出 线路工程,线路 全长 13.66km	线路总长度 13.66km	无	否
4	变电站、换流 站、开关站、串 补站站址位移 超过 500 米	本工程为光伏发 电的送出线路, 不涉及变电站、 换流站、开关站、 串补站站址位移	本工程为光伏发 电的送出线路, 不涉及变电站、 换流站、开关站、 串补站站址位移	无	否
5	输电线路横向 位移超出 500 米的累计长度 超过原路径长 度的 30%	无	无	无	/

					_
6	因输变电工程 路径、站址等发 生变化,导致进 入新的自然保 护区、风景名胜 区、饮用水水源 保护区等生态 敏感区	线路未经过国家 公园、自然保护 区、风景名胜区、 世界文化和自然 遗产地、海洋特 别保护区	本工程实际输变 电工程路径未发 生变化,线路未 经过国家公园、 自然保护区、风 景名胜区、世界 文化和自然遗产 地、海洋特别保 护区	无	否
7	因输变电工程 路径、站址等发 生变化,导致新 增的电磁和声 环境敏感目标 超过原数量的 30%	/	本工程实际输变 电工程路径未发 生变化,未新增 环境敏感目标	无	否
8	变电站由户内 布置变为户外 布置	不涉及	不涉及	无	/
9	输电线路由地 下电缆改为架 空线路	本工程为光伏发 电项目的送出线 路,采用架空方 式	输电线路采用架 空方式	无	否
10	输电线路同塔 多回架设改为 多条线路架设 累计长度超过 原路径长度的 30%	本工程为光伏发电项目送出线路,难以与其他线路同塔架设或并行架设,设有34座塔基	本工程为光伏发 电项目送出线 路,难以与其他 线路同塔架设或 并行架设,设有 34座塔基	无	否

根据实际现场调查,同时对比《输变电建设项目重大变动清单(试行)》(环办辐射 [2016]84 号),建设内容均与环评一致,无变动情况,本工程不涉及重大变动的情况。

五、环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论(生态、电磁、声、水、固体废物等):

一、生态环境现状

(1) 生态环境

本工程不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年)中输变电工程应关注的生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ 24-2020),"进入生态敏感区的输电线路段或接地极线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域,其余输电线路段或接地极线路段生态影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域"。因此,本线路生态环境评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m带状区域,面积为812.15hm²。

(2) 声环境

本工程送出线路沿线声环境评价范围内无声环境保护目标,未进行声环境质量现状监测。

(3) 电磁环境现状

根据本项目电磁环境现状监测结果和电磁环境专题评价,本工程架空线路跨越 G337 国道(黄榆线)处的工频电场强度为 0.449V/m,工频磁感应强度为 0.0858μT,跨越 220kV 第 岚线处和 110kV 高岚线的工频场强度分别为 562.5V/m、344.7V/m,工频磁感应强度分别为 0.6833μT、2.0855μT,线路π接处工频电场强度为 455.0V/m,工频磁感应强度为 0.5353μT,均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中 10kV/m 和 100μT 的公众暴露控制限值要求,区域电磁环境现状良好。

(4) 水环境

岚县最大的河流是岚河,是汾河的一级支流,发源于河口乡马头山,主要支流有岚城河、 普明河、上明河、黄签河、顺会河和南川河。

本工程线路跨越区采用一档跨越,不在河道管理控制范围设立杆塔,不设置临时施工区, 符合《山西省汾河保护条例》要求。

二、环境影响预测

(1) 电磁环境影响分析

根据本工程送出线路电磁环境影响采用模式预测法。根据预测结果:

1) 同塔双回线路电磁环境影响预测

根据设计单位提供的线路平断面图,本工程双回线路导线弧垂最小对地高度约19.17m,本次评价预测了导线弧垂最小对地高度19.17m时的电磁环境影响根据预测结果,当导线弧垂

最小对地高度19.17m时,产生的工频电场强度最值为1.413kV/m,工频磁感应强度为1.274μT,满足《电磁环境控制限值(GB8702-2014)10kV/m、100μT的控制限值。

2) 单回线路电磁环境影响预测

根据设计单位提供的线路平断面图,本工程单回线路导线弧垂最小对地高度约26.38m,本次评价预测了导线弧垂最小对地高度26.38m时的电磁环境影响根据预测结果,当导线弧垂最小对地高度26.38m时,产生的工频电场强度最力值为0.560kV/m(距导线中心16m和17m处),工频磁感应强度为0.772μT,满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)10kV/m、100μT的控制限值。

(2) 声环境影响分析

本工程送出线路同塔双回架空线路长13.04km,单回线路0.62km,噪声源主要是220kV 高压线的电晕放电而引起的噪声,噪声级很小。

本次采用类比预测分析线路运营后对周围声环境的影响,选取已投运的单回路架设的山西运城市万荣县的 220kV 河万 II 线作为类比对象。类比监测结果表明,类比的河万 II 线 71#~72# 段 线 路 两 侧 $0\sim50$ m 昼 间 噪 声 值 为 46.5dB(A)~48.4dB(A), 夜 间 噪 声 值 34.5dB(A)~36.2dB(A),均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1 类标准要求。

选取已投运的双回路架设的山西运城市夏县夏桐 I、II回 220kV 双回线路作为类比对象。类比监测结果表明,类比的夏桐I、II回 220kV 双回线路两侧 0~40m 昼间噪声值为31.7dB(A)~42.6dB(A),夜间噪声值 28.0dB(A)~37.2dB(A),均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1 类标准要求。

本工程线路沿线声环境评价范围内无声环境敏感目标,本工程送出线路运行期产生的噪声不会对线路周围的声环境噪声明显影响。

吕梁市行政审批服务管理局审批意见:

吕梁市行政审批服务管理局 2025 年 6 月 24 日以吕审批发函[2025]244 号对该项目环境 影响报告表进行了批复。批复意见如下:

一、华电岚县光伏发电项目 220kV 送出工程始于岚县岚城镇阳湾村拟建的华电岚县光 伏发电项目 220kV 升压站,止于岚县上明乡阳坡村旭东升风电项目~铜鼓山光伏项目 220kV 送出线路,途经吕梁市岚县岚城镇、东村镇、上明乡境内。主要建设内容包括新建 220kV 架空线路长度 13.66km,其中同塔回架空线路 13.04km,单回路架空线路 0.62km。新建铁塔 34 基,其中新建双回铁塔 32 基,单回铁塔 2 基。该项目总投资 5486 万元,其中环保投资 83.26 万元,占工程总投资的 1.52%。

该项目经吕梁市行政审批服务管理局予以核准,项目代码: 2407-141100-89-05-168110,符合国家产业政策。依据山西明宇环境科技工程有限公司《评估报告》(明宇咨【2024】023

- 号),在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施后,不利影响能够得到一定的有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
 - 二、项目建设及运行中应重点做好以下工作:
- (一)严格落实施工期生态保护和恢复措施。注意对熟化土壤的保护和利用,施工前, 先把表层的熟化土壤推到合适的地方并集中起来;待施工结束后,再施用到要进行植被建设 的地段,使其得到充分、有效地利用。在进行植被恢复与重建过程中,要选择适应于当地生 长的土著植物,提高植被覆盖率,有助于重建植被的完整性与原生植被的统一性,对临时占 用的旱地进行原地复耕。
- (二)强化施工期大气污染防治措施。加强施工现场管理,严格做好土方、运输车辆的 遮盖以及道路洒水等抑尘措施。建筑工地必须做到"6个100%"扬尘防治要求。
- (三)落实水污染防治措施。严格执行《建设工程施工工地文明施工及环境管理暂行规定》,对施工废水进行妥善处理。施工废水经沉淀池沉淀后,全部回用于洒水降尘。施工人员就近租用民房,生活污水依托当地已有的生活污水处理设施进行处理。
- (四)落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间,做到文明施工,采取有效措施,严格控制施工噪声对周围环境的影响。选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电等措施来降低线路运行对周围声环境的影响,确保线路运行期间线路沿线声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求。
- (五)加强固体废物污染防治措施。做好施工期土石方平衡,弃土弃渣应合理处置,不得沿坡倾倒,污染环境。施工过程中的建筑垃圾采用分类收集,可回用的统一收集回用,不能回用的收集后统一清运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员生活垃圾收集后送环卫部门指定地点集中处置。确保固体废物均合理处置。
- (六)严格落实防治工频电场、工频磁场等环境保护措施。输电线路合理布置,通过提高导线对地高度,优化导线相间距离以及导线布置,降低输电线路对周围电磁环境的影响,确保线路沿线工频电磁场强度水平符合标准。
- 三、你公司应落实生态环境保护主体责任,建立内部生态环境管理机构和制度,明确机构、人员、职责和制度,加强生态环境管理,推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护"三同时"制度。项目建成后,应按规定程序开展竣工环境保护验收工作。
- 四、项目开工前须依法依规办理用地相关审批手续,确保项目用地选址合法合规。建设场地须满足土地、规划等方面的要求。
- 五、吕梁市生态环境局、吕梁市生态环境局岚县分局,按照各自职责负责该项目"三同时"监督检查及日常管理工作。
- 六、你公司收到本批复后 10 个工作日内,要将批准后的环境影响报告表分送吕梁市生态环境局、吕梁市生态环境局岚县分局,并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、环境保护设施、环境保护措施落实情况

		表 6-1 环评要求的环境保护设施、	环境保护措施落实情况	
阶段	躺幾	环 州给表要 求	实际建设情况	落实情况
施一		对场地内后续进行旱地恢复、植被恢复区域进行土地整治,土地整治内容包括坑洼回填、翻耕、耙松等工序,采用 74kW推土机推平,局部推土机无法进入的边角可采用人工推平。 ②植被措施 在施工结束后,对该区占地类型为其	工场地进行表土回覆,已恢复原貌。 植物措施: 经现场调查,占地类型为 其他草地和灌木林地,植被恢 复时,选择撒播品质优良的油 松和撒播草籽的方式恢复植 被;占地类型为基本农田的营 恢复耕地,并种植玉米、土豆。 详见照片页。 临时措施: 经现场调查:在施工中, 对塔基工程区和相邻施工便 道剥离的表土及开挖产生的	已落实
工期	影响	整治(恢复植被)区域进行防护网苫盖。	盖。施工后期,对植被恢复区域进行防护网苫盖。	
		(2) 牵张场地 ①工程措施 对场地内后续进行旱地恢复、植被恢复区域进行土地整治,土地整治内容包括坑洼回填、翻耕、耙松等工序,采用 74kW推土机推平,局部推土机无法进入的边角可采用人工推平。 ②植被措施 在施工结束后,对该区占地类型为其他草地区域进行植被恢复,植被恢复选取植草方式,草籽选择品质优良的披碱草,种植方式为撒播。	工程措施: 经现场调查,施工结束后已对占地区域内土地进行整治,耕地恢复、植被恢复区域进行了坑洼回填、翻耕、耙松。植被恢复: 经现场调查,占地类型主要为旱地和其他草地,植草型主要为旱地和其他草地,植草方式。详见照片页。 临时措施: 经现场调查,施工过程中地面采用铺设钢板方式,施车站,并近有	己落实

(3) 跨越施工区

①工程措施

对场地内后续进行旱地恢复区域进行**植被恢复:** 土地整治,土地整治内容包括坑洼回填、 翻耕、耙松等工序,采用 74kW 推土机推平,时,选择撒播品质优良的油松 局部推士机无法进入的边角可采用人工推和撒播草籽;占地类型为基本 平。

②临时措施

对跨越施工区采用彩条布对原地表进临时措施: 行铺垫,避免施工期间对原地表土壤结构 破坏。施工结束揭除彩条布后,进行土地区采用彩条布对原地表进行 整治和植被恢复,施工后期,对土地整治铺垫,避免施工期间对原地表 区域进行防护网苫盖。

(4) 施工便道

①工程措施

施工前,对区内占地类型为旱地和其 他草地区域进行表土剥离, 施工结束后, 对本区进行表土回覆。对场地内后续进行 旱地恢复、植被恢复区域进行土地整治, 土地整治内容包括坑洼回填、翻耕、耙松 等工序, 采用 74kW 推土机推平, 局部推士 机无法进入的边角可采用人工推平。

②植被措施

在施工结束后,对该区占地类型为其 他草地区域进行植被恢复,植被恢复选取 植草方式。草籽选择品质优良的披碱草, 种植方式为撒播。

③临时措施

施工后期,对土地整治(恢复植被)区 域进行防护网苫盖。

(5) 农田保护措施:

采用高低腿型式的铁塔和挖孔基础等 原状土基础;通过优化设计方案,扩大部 分塔基间的档距; 即埋即填, 即挖坑建设 塔基后立即回填。

工程措施:

经现场调查,施工结束后 已对占地区域内土地进行整 治,回填和翻耕。

经现场调查, 植被恢复 农田已恢复耕地,种植玉米、 土豆。详见照片页。

经现场调查,对跨越施工 土壤结构破坏。施工结束揭除 彩条布后,进行土地整治和植 被恢复, 施工后期, 对土地整 治区域进行防护网苫盖。

工程措施:

经现场调查,施工前,对 区域内占地类型为旱地和其 他草地区域进行表土剥离,并 采取苫盖措施。施工结束后, 进行表土回覆。对场地内占用 的耕地进行耕地恢复。

植被恢复:

经现场调查,施工结束 后,对该区进行植被恢复,基 本农田种植玉米、土豆, 草地 区进行植草方式,详见照片 页。

临时措施:

施工后期,对植被恢复区 域进行防护网苫盖。

施工时充分利用地形、地 |貌等条件,采用高低腿式的铁 塔和挖孔基础等原状土基础, 既满足运行生产安全方便,又 减少了占地面积。再者通过优 化设计方案,扩大部分塔基间 的档距,同时做到即埋即填, |以最大限度维持土地原状。

己落实

己落实

己落实

			-	
		水环境:项目不设施工营地,租用G337国道旁民房,施工期生活污水依托其生活污水处理设施进行处理,不外排。施工废水经沉淀后循环利用。跨越上明河和黄签河时采用一档跨越方式,不在河道管理范围内设立杆塔和临时施工场地。	活污水处理设施进行处理,不外排。施工场地设置沉淀池,产生的废水经收集沉淀后后回用于场地洒水降尘,不外排。跨越上明河和黄签河时采用一档跨越方式,不在河道管理范围内设立杆塔和临时施工场地。	已落实
I I T		声环境:合理安排施工时间,避免夜间施工;在施工场地周围使用隔音设施,同时使用低噪声机械设备。		已落实
		大气环境:建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输"六个百分之百"。	施工边界设置不低于 1.8m高的围挡;施工中物料 堆场采取遮盖、洒水或其他防	己落实
			置;施工工人生活垃圾及时清	
环境保	生态 影响	制定植被恢复管理计划,定期巡查植被恢 复情况,监测恢复区植被覆盖度,做好记 录,对长势不良的植被及时进行补植,对	实施方案,以确保生态环境有	已落实

护	未成活的区域进行土壤改良和植被补栽。	中,建立了规范的定期巡查制	
设		度,组织专业人员定期针对植	
施		被恢复情况进行全面细致的	
调		实地检查,将巡查结果和监测	
试		数据都形成规范的书面记录,	
期		长期保存。对巡查中发现的长	
		势不良的植被,及时分析原	
		因,并采取针对性措施,进行	
		补植修复。对于反复出现未成	
		活情况的区域,及时组织专家	
		进行土壤理化性质检测和改	
		良,根据检测结果,采取适宜	
		的土壤改良措施,并选择适应	
		性更强的植被品种进行补栽。	
		为有效降低输电线路运	
		行过程中产生的噪声对周边	
		环境的影响,定期组织了专业	
		技术人员对送出线路进行全	
	声环境:	面细致的检修维护工作,重点	
	定期对送出线路进行检修维护,保证	检查导线连接部位等关键部	己落实
	送出线路运行良好。	件的运行状态;同时定期对线	口俗失
		路沿线进行噪声水平进行检	
		测,及时发现并处理可能产生	
		噪声的隐患,确保送出线路始	
		终处于最佳运行状态,最大限	
		度地减少了噪声污染。	
污染		制定了电磁环境监测方	
影响		案,配备专业的监测设备和人	
		员,加强监测工作,一旦发现	
		异常情况,立即开展处置工	
	电磁环境:	作;在架空线路周边区域,规	
	①加强电磁环境监测,及时发现问题		
	并按照相关要求进行处理; ②在架空线路	;	
	附近及杆塔处设立警示和防护指示标志;	安全防护标识,明确标注安全	口俗头
	③采用提高了导线对地高度,优化导线相	即岛和汪恵事坝; 适当提局了	
	间距离以及导线布置。	导线的对地安装局度, 确定最	
		优的相间距离,并采用合理的	
		导线排列方式,最大限度地降	
		低了电磁环境影响,确保周边	
		人员和设备的安全。	

影响 类别	环评批复要求	实际建设情况	落实情况
生态影响	严格落实施工期生态保护和恢复措施。注意对熟化土壤的保护和利用,施工前,先把表层的熟化土壤推到合适的地方并集中起来行植被建设的地段,使其得到充分、有效地利用。在进行植被恢复与重建的大量建设的,是高植被复造率,有助生生者植物,提高植被覆盖率,有助生生者被的完整性与原生植被的即生地进行原地复耕。	施工以利用 不可以	已落实
电磁染响	严格落实防治工频电场、工频 磁场等环境保护措施。输电线路合 理布置,通过提高导线对地高度, 优化导线相间距离以及导线布置, 降低输电线路对周围电磁环境的影 响,确保线路沿线工频电磁场强度 水平符合标准	设计时尽量避开人口。 一个人员,通过计算,适当是的居民区,通过计算,适当,通过计算,高度,通过计安装。高度,用度,对地安装。有度,用度,对的是,是一个人员。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种	己落实

		施工边界设置不低于	
大气污染影响	强化施工期大气污染防治措施。加强施工现场管理,严格做好土方、运输车辆的遮盖以及道路洒水等抑尘措施。建筑工地必须做到"6个100%"扬尘防治要求。	1.8m 高的围挡;施工中物料堆场采取遮盖、洒水或其他防尘措施;运输、装卸建筑材料时,以当地三轮车进行运输,运输时进行苫盖,低速行驶,以降低扬尘对周围环境的影响;保证物料不遗撒外漏,产生的建筑垃圾及时运至指定的建筑垃圾处置场处置。	已落实
水污染影响	落实水污染防治措施。严格执行《建设工程施工工地文明施工及环境管理暂行规定》对施工废水进行妥善处理。施工废水经沉淀池沉淀后,全部回用于洒水降尘。施工人员就近租用民房,生活污水依托当地已有的生活污水处理设施进行处理。	施工工人租用沿线附近村庄民房,不再另设施工营地。施工期生活污水依托其生活污水处理设施进行处理,不外排。施工场地设置沉淀池,产生的废水经收集沉淀后后回用于场地洒水降尘,不外排。各单位严格贯彻执行《建设工程施工工地文明施工及环境管理暂行规定》的各项要求,通过标准化管理实现施工现场卫生有序、环境影响可控。	已落实
噪声 污染 影响	落实噪声污染防治措施。合理 安排施工时间,做到文明施工,采 取有效措施,严格控制施工噪声对 周围环境的影响。选用加工工艺水 平高、表面光滑的导线减少电晕放 电等措施来降低线路运行对周围声 环境的影响,确保线路运行期间线 路沿线声环境满足《声环境质量标 准》(GB3096-2008)中1类标准要 求。	为有效降低电晕放电产生的噪声,选用加工工艺先进、表面处理精细的导线,确保导线表面光滑;同时优化导线排列方式,采用合理的相间距离和分裂间距,进一步减少电晕放电。通过以上措施,确保项目线路运行期间线路沿线声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求。	已落实
固 废 污 影响	加强固体废物污染防治措施。 做好施工期土石方平衡,弃土弃渣 应合理处置,不得沿坡倾倒,污染 环境。施工过程中的建筑垃圾采用 分类收集,可回用的统一收集回用, 不能回用的收集后统一清运至环卫 部门指定地点倾倒。施工人员生活 垃圾收集后送环卫部门指定地点集 中处置。确保固体废物均合理处置。	施工期做到了土石方平 衡: 工程挖填土石方总量 1.92 万 m³, 其中挖方 0.96 万 m³, 填方 0.96 万 m³, 做到土石方 平衡, 无弃方。施工过程中产 生的建筑垃圾分类收集, 对于 可回收利用的, 如钢筋、木材 等, 统一回收利用; 不可应收利所。 处置场处置; 施工工人生活垃 圾及时清运至环卫部门指定的 地点,交由环卫部门处理,做 到建筑垃圾和生活垃圾分类收 集。固体废物管理过程严格的 基本原则,做到分类收集、合 理处置。	己落实

七、电磁环境、声环境监测

电磁环境监测

监测因子及监测频次:

监测因子: 工频电场强度、工频磁感应强度。

监测频次: 监测 1 次。

监测方法及监测布点:

(1) 监测方法

按照《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)进行。

(2) 监测布点原则

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)要求,监测布点原则如下:

输电线路断面监测应按照电压等级、排列方式等选择代表性断面进行监测。对于跨省级 行政区的输电线路,每个省级行政区内至少应选择一处断面进行监测。如不具备断面监测条 件,应说明原因。

(3) 监测布点

表 7-1 电磁环境监测布点一览表

监测类别	监测点位	监测项目	测试要求		
电磁辐射	线路 SG7~SG8 段跨越 220kV 第	工频电场强度、工 频磁感应强度	记录监测时的温度、相 对湿度等环境条件以及 监测仪器监测时间等。		
电磁环境	线路衰减断面,线路设置电磁辐射衰减断面监测点位,即以强垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点,在线路一侧断面方向布设监测点,测点间距为 5m,至距离边导线对地投影外 50m 止。本次选取 SG18-SG19 塔间线路	工频电场强度、工频磁感应强度	记录监测时的温度、相 对湿度等环境条件以及 监测仪器监测时间等。		
备注	1、监测点应选择在地势平坦、远离树木且没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上; 2、监测仪器探头应架设在地面(或立足平面)上方 1.5m 高度处。也可选择其他高度,并在监测报告中注明;				

监测单位、监测时间、监测环境条件:

- (1) 监测单位: 山西志源生态环境科技有限公司。
- (2) 监测时间: 2025年9月26日。
- (3) 监测环境条件:

时间	天气状况	温度 (℃)	湿度 (%RH)	天气(kPa)	风速(m/s)
昼间	晴	24	46	87.2	1.3
夜间	多云	12	47	87.5	1.4

监测仪器及工况:

(1) 监测仪器

表 7-2 监测仪器设备一览表

	农 / 2		
	工频电场强度、工频磁感应强度		
仪器名称	电磁辐射分析仪(含工频探头)		
型号	SEM-600/LF-04		
设备编号	ZYYQ-JC-11		
检定/校准证书编号	24J02X102226		
检定/校准有效期	2024年11月1日至2025年10月31日		
仪器性能	1Hz-400kHz		

(2) 监测工况

工程实际运行电压达到设计额定电压等级。监测期间送出线路运行工况为 229.68kV、

236.78A。 监测结果分析:

表 7-3 工频电场强度、工频磁感应强度监测结果一览表

序号	监测点位	监测项目	单位	检测结果
1 1 1	线路 SG7~SG8 段跨越 220kV	工频电场强度	V/m	501.0
	第岚线处	工频磁感应强度	μТ	0.8863
2	。 线路 SG16~SG17 段跨越	工频电场强度	V/m	180.2
2 G337 过:	G337 过道(黄榆线)处	工频磁感应强度	μТ	0.5621
3 线距	线路 SG29~SG30 段跨越	工频电场强度	V/m	589.4
	110kV 高岚线处	工频磁感应强度	μТ	0.6733
4 线路π接处	外吸力放	工频电场强度	V/m	892.1
	线路π接处	工频磁感应强度	μТ	0.5167
14	SG18~SG19塔间线路弧垂 最低处中导线下 0 米	工频电场强度	V/m	995.5
		工频磁感应强度	μТ	0.7527

15	SG18~SG19塔间线路弧垂最	工频电场强度	V/m	883.5
	低处中导线外 5 米	工频磁感应强度	μТ	0.7094
1.6	SG18~SG19塔间线路弧垂	工频电场强度	V/m	723.8
16	最低处中导线外 10 米	工频磁感应强度	μТ	0.6071
17	SG18~SG19 塔间线路弧垂 最低处中导线外 15 米	工频电场强度	V/m	446.9
		工频磁感应强度	μТ	0.5027
10	SG18~SG19塔间线路弧垂	工频电场强度	V/m	317.2
18	最低处中导线外 20 米	工频磁感应强度	μТ	0.4524
10	SG18~SG19塔间线路弧垂	工频电场强度	V/m	216.8
19	最低处中导线外 25 米	工频磁感应强度	μТ	0.3957
20	SG18~SG19 塔间线路弧垂 最低处中导线外 30 米	工频电场强度	V/m	116.7
20		工频磁感应强度	μТ	0.3436
21	SG18~SG19 塔间线路弧垂 最低处中导线外 35 米	工频电场强度	V/m	60.87
		工频磁感应强度	μТ	0.2949
22 S	SG18~SG19 塔间线路弧垂最 低处中导线外 40 米	工频电场强度	V/m	20.35
		工频磁感应强度	μТ	0.2421
S	SG18~SG19塔间线路弧垂最	工频电场强度	V/m	10.84
23	低处中导线外 45 米	工频磁感应强度	μТ	0.2080
24	SG18~SG19塔间线路弧垂最	工频电场强度	V/m	8.587
24	低处中导线外 50 米	工频磁感应强度	μТ	0.1459

本工程工频电场强度、工频磁感应强度监测布点及测量方法主要依据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)、《交流输变电工程电磁环境监测方法(实行)》(HJ681-2013)。根据山西志源生态环境科技有限公司提供的《华电岚县光伏发电项目送出线路项目竣工环境保护验收监测监测报告(ZYJC2509029)》,本工程送出线路工频电场强度为180.2~892.1V/m,工频磁感应强度为0.5167~0.8863μT;塔间线路弧垂最低处中导线外0-50米内(以对地投影为起点,测点间距为5m,至距离边导线对地投影外50m止。本次监测选择 SG18~SG19 塔间。)工频电场强度为8.587~995.5V/m,工频磁感应强度为0.1459~0.7527μT。综上,本工程220kV送出线路运营期间产生的工频电场工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度10kV/m和工频磁场强度100μT的公众暴露限值要求,不会对周围环境造成明显不利的影响。

声环境监测

监测因子及监测频次:

监测因子: 等效连续 A 声级(Leg), 单位: dB(A)。

监测频率: 监测 1 天, 分昼、夜监测。

监测方法及监测布点:

(1) 监测方法

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 进行。

(2) 监测布点原则

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》(HJ705-2020)要求,监测布点原则如下,监测布点原则如下:

线路测点选取边导线线下线路中心线地面投影(弧垂最低点)。

(3) 监测布点

在线路 SG7~SG8 段跨越 220kV 第岚线处、线路 SG16~SG17 段跨越 G337 过道(黄榆线)处、线路 SG29~SG30 段跨越 110kV 高岚线处、线路π接处各设置 1 个监测点位,共设 4 个监测点位。

监测单位、监测时间、监测环境条件:

- (1) 监测单位: 山西志源生态环境科技有限公司。
- (2) 监测时间: 2025年9月26日。
- (3) 监测环境条件:

时间	天气状况	温度(℃)	湿度 (%RH)	天气(kPa)	风速 (m/s)
昼间	晴	24	46	87.2	1.3
夜间	多云	12	47	87.5	1.4

监测仪器及工况:

(1) 监测仪器

表 7-4 噪声监测仪器设备一览表

	功能区噪声			
仪器名称	多功能声级计			
型号	AWA5688			
设备编号	ZYYQ-JC-02			
检定/校准证书编号	JL25A00899985			
检定/校准有效期	2025年1月25日至2026年1月24日			
仪器性能	35dB~130dB(A)			

(2) 监测工况


工程实际运行电压达到设计额定电压等级。监测期间送出线路运行工况为 229.68kV、236.78A。

监测结果分析

表 7-6 噪声监测结果一览表

序号	监测点位	监测时间	单位	监测结果(leq)
1	线路 SG7~SG8 段跨 越 220kV 第岚线处	昼间(11:32)	dB(A)	42.7
		夜间(22:04)	dB(A)	39.9
2	线路 SG16~SG17 段	昼间(12:13)	dB(A)	44.6
2	2 跨越 G337 过道(黄 榆线)处	夜间(22:43)	dB(A)	40.8
2	线路 SG29~SG30 段	昼间(15:15)	dB(A)	42.0
3	跨越 110kV 高岚线 处	夜间(23:09)	dB(A)	39.6
4	线路π接处	昼间(16:00)	dB(A)	42.3
		夜间(23:55)	dB(A)	39.3

根据山西志源生态环境科技有限公司提供的《华电岚县光伏发电项目送出线路项目竣工环境保护验收监测监测报告(ZYJC2509029)》,本工程送出线路昼间噪声为 42.0~44.6dB(A),夜间为 39.3~40.8dB(A),满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1 类标准限值要求。可见工程运营后噪声对周围居民不会产生明显影响。

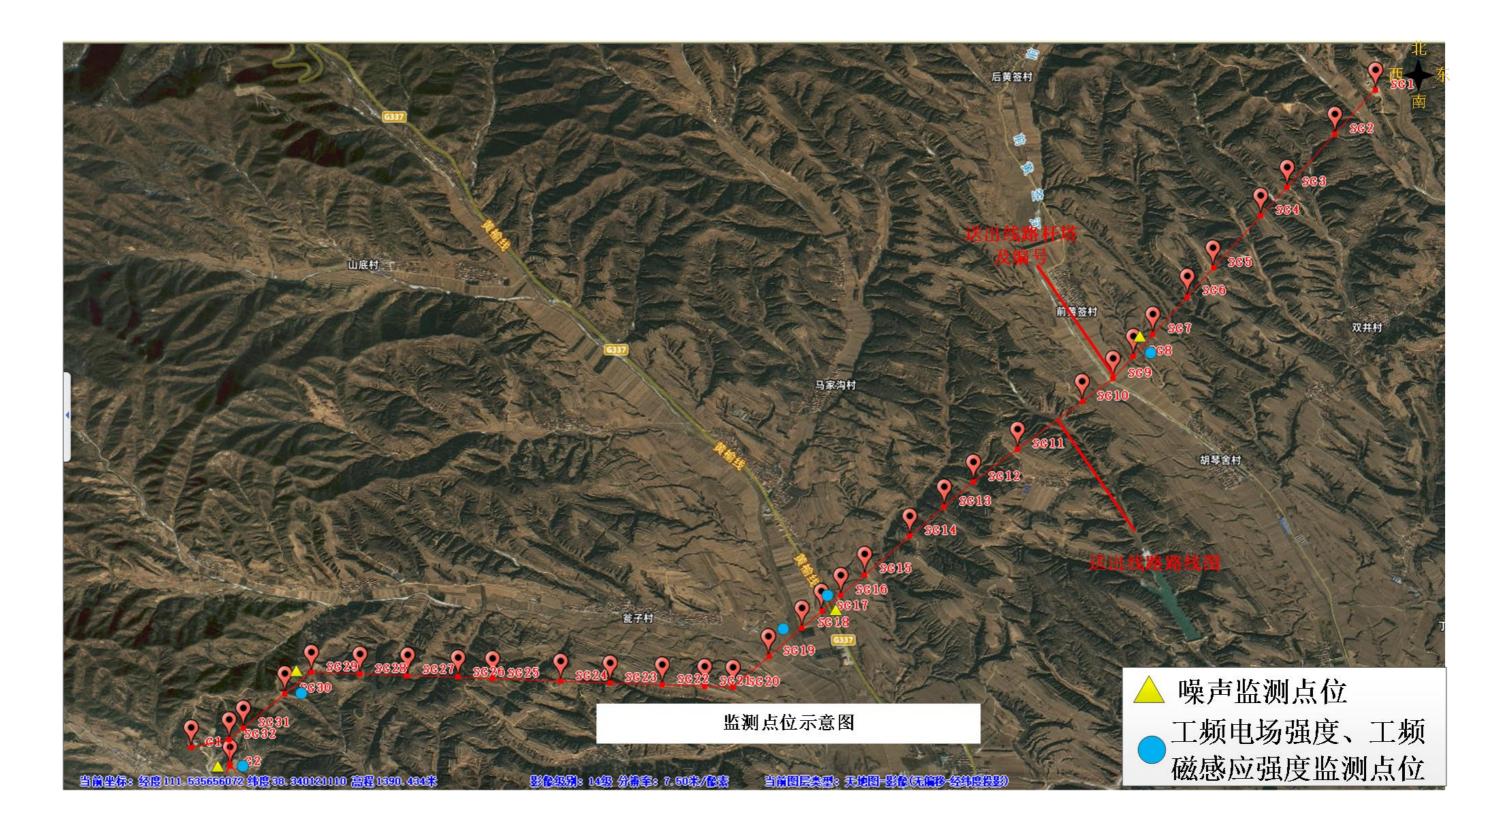

八、环境影响调查

施工期

生态影响:

工程用地主要包括改变功能和非改变功能两类,前者为线路杆塔基础占地,后者为工程临时用地等。因送出线路杆塔基础占地面积小、且较为分散,对当地总体的土地利用现状影响很小;虽可能降低原有耕地的生产能力,但农田的面积未大幅减少,对农业生产的影响较小;送出线路永久占地破坏的植被仅限塔基范围之内,占地面积小,对当地常见植被的破坏也较少;送出线路全线不涉及需要保护的珍稀动、植物。已合理选择线路路径,全部使用高塔,降低了电力线路对周围电磁环境的影响;工程施工结束后,施工单位对线路工程临时占地与施工现场恢复了原有的使用功能,对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。

污染影响:

- 1.施工期噪声:经调查,施工期间使用低噪声设备;合理选择和安排了施工时段,尽量避免午间和夜间施工;避免高噪声设备同时施工,闲置不用的设备立即关闭;施工时设置临时的隔声屏障;车辆经过居民区时减速通过,未发生声扰民现象;
- 2.施工期扬尘:经调查,施工边界设置了围挡,施工期间采用了商品混凝土,建筑垃圾密闭,裸露场地苫盖,洒水抑尘,以当地三轮车进行运输,运输时进行苫盖,低速行驶,有效降低了扬尘现象对周围环境的影响;
- 3.施工期废水和生活污水:经调查,施工场地设置了简易的沉淀池,少量基础养护废水 沉降后泼洒抑尘,不外排;施工人员租赁附近村庄民房,不另设施工营地,生活污水依托村 民现有污水处理设施;
- 4.固体废弃物:经调查,施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾做到了分类收集,并已及时清运。余土临时占地就地平铺;
- 5.生态:本工程线路沿线无风景名胜区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区;本工程未涉及生态红线及县城集中式饮用水源地。

环境保护设施调试期

生态影响:

经调查,《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011)生态影响评价主要适用于水利、水电、矿业、旅游等自然资源开发利用项目。本工程属于普通的高压输变电工程,对沿线动植物的生存环境影响很微弱。工程生态环境影响主要产生在施工期,属于短期影响而非长期影响。合理选择了架空线路路径,降低电力线路对周围电磁环境的影响。

污染影响:

- 1.电磁环境影响:线路电磁环境监测结果符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的 10kV/m、 $100\mu T$ 的标准限值要求。
- 2.噪声环境影响:线路周围符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准,昼间55dB(A),夜间45dB(A)。
 - 3.加强线路运行维护,降低线路对周围电磁环境、声环境的影响。

九、环境管理及监测计划

环境管理机构设置

(1) 施工期环境管理

为了保证环境保护措施得到落实,建设单位将环境保护内容作为合同条款纳入到合同中,要求施工单位按评价要求科学、合理施工,项目单位定期对工程施工情况进行监督。同时委托有资质的单位开展工程建设的环境监理工作,确保落实环评及生态环境主管部门提出的各项环保措施。

(2) 环境保护调试期环境管理

为保证本工程各项环保设施正常有效运行和搞好项目的环境管理工作,建设单位设立环境管理组织,负责整个厂区的环保工作。负责对项目废气、废水、噪声、电磁环境和固体废物处理处置情况进行监督管理,对外的环保协调工作,履行环境管理和环境监控职责。

环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况:

(1) 环境监测计划落实情况

本工程在竣工环境保护阶段,已由第三方监测单位对本工程的工频电场强度、工频 磁感应强度及噪声进行了验收监测;后期,建设单位将按照相要求进行监测。

(2) 培训管理

建设单位在施工期、运行期进行了针对生态红线区保护、水土保持、电力设施保护 保养等方面的培训。

(3) 环境保护档案管理情况

本工程所产生的环保资料由公司相关部门统一进行了整理并归档。经调查,工程可研、初设、设备安装、调试、环评等阶段的环保资料及相关批复文件均已统一归档成册,并安排专人负责管理。

环境管理状况分析

建设单位在运行期做好环境保护设施的维护和运行管理,加强巡查和检查,保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测,确保电磁、噪声符合 GB8702-2014、GB3096-2008 等国家标准要求,并及时解决公众合理的环境保护诉求。

十、竣工环境保护验收调查结论与建议

调查结论:

1.工程建设过程

华电岚县光伏发电项目为 220kV 送出工程位于吕梁市岚县上明乡、东村镇和岚城镇。2025年 4月 22日,吕梁市行政审批服务管理局以吕审批发[2025]154号"关于华电岚县光伏发电项目送出线路项目核准的批复"同意本项目建设。2025年 6月,山西同盛科技有限公司编制完成本项目环评报告表。2025年 6月 24日,吕梁市行政审批服务管理局以吕审批发函[2025]244号文件对本项目环境影响报告表予以批复。

本工程于 2025 年 6 月 26 日开工建设, 2025 年 9 月 10 日建设完成, 2025 年 9 月 20 日进行调试运营。

2.工程建设内容

(1)线路: 从华电岚县光伏发电项目 220kV 升压站架空出线,向西架空跨越 220kV 第岚县,继续向西至前黄签村西南角,向西北至翁子村东南角,继续向西北跨越 110kV 高岚线后至π接入旭东升风电~铜鼓山光伏 220kV 线路,通过铜鼓山光伏~袁家村站 220kV 线路送出。

(2) 拆除工程

已严格按照拆除方案拆除与旭东升风电~铜鼓山光伏 220kV 线路π接处 031 号和 032 号塔基及其之间的架空线路,并对拆除线路产生的塔材、导线、金具等物料统一交由电力公司部门集中处置,现场无遗留,已对占地进行植被恢复。

本工程的实际总投资5800万元,环保投资86万元,环保投资占总投资的1.47%。

3.工程变动情况

根据《输变电建设项目重大变动清单(试行)》(环办辐射[2016]84号),本工程 不涉及重大变动的情况。

4.环保措施落实情况

本工程设计、施工和运行阶段各项环保措施均已按环评报告表及其批复要求落实, 验收监测结果表明电磁环境和声环境可以满足各项标准限值要求,环保措施有效。

5.环境影响调查

(1) 生态影响调查

本工程线路沿线无风景名胜区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区;本工程未涉及生态红线及县城集中式饮用水源地,与环评阶段一致。施工在永久占地及临时占地范围内进行,利用了现有道路或在原有路基上拓宽,减少了临时占地。施工结束后产生的少量土方已用于塔基回填及临时占地就地平铺,破坏的植被除铁塔四个支撑脚处外均已恢复。牵张场等临时占地已恢复原有功能,对当地生态影响很小。

(2) 电磁环境影响

监测期间,送出线路工频电场强度为 180.2~892.1V/m,工频磁感应强度为 0.5167~0.8863µT; 塔间线路弧垂最低处中导线外 0-50 米内(以对地投影为起点,测点间

距为 5m,至距离边导线对地投影外 50m 止。本次监测选择 SG18~SG19 塔间。)工频电场强度为 8.587~995.5V/m,工频磁感应强度为 0.1459~0.7527μT。综上,本工程 220kV 送出线路运营期间产生的工频电场工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度 10kV/m 和工频磁场强度 100μT 的公众暴露限值要求。

(3) 声环境影响

监测期间,送出线路昼间噪声为 42.0~44.6dB(A), 夜间为 39.3~40.8dB(A), 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值要求。

6.综合结论

综上所述,华电岚县光伏发电项目 220kV 送出工程在建设过程中基本落实了环评文件、环保设计及其批复文件提出的各项环境保护措施和要求,在设计、施工和运行期已采取的生态保护、污染防治措施有效,工频电磁场监测结果符合相应标准限值要求,符合竣工环境保护验收规定,已具备竣工环境保护验收条件。

建议:

- 1、进一步完善环境保护管理制度及操作规程,加强对线路平时的巡视和维护,确保设施正常运行:
 - 2、加强企业环境保护监督管理,树立良好的企业环境保护形象;
 - 3、加强对线路沿线周边群众的电力保护和环境保护的宣传。

附件 2

吕梁市行政审批服务管理局文件

吕审批发 (2025) 154号

吕梁市行政审批服务管理局 关于华电岚县光伏发电项目送出线路 项目核准的批复

岚县华电新能源有限贵任公司:

报来《关于申请批复华电岚县光伏发电项目送出线路项目申请报告核准的请示》(华电岚县办字(2025)6号)及相关材料收悉。根据《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》(山西省人民政府令第258号)《山西省政府核准的投资项目目录(2017年本)》(晋政发(2017)26号),结合山西华咨城乡发展规划设计有限公司对该项目评估意见报告(山西华咨(2025)0421号),经认真研究,现就该项目核准事项批复如下:

-1-

- 一、为保证华电岚县光伏发电场电力及时送出,提高供电能力,促进地方经济快速发展,原则同意华电岚县光伏发电项目送出线路(项目代码: 2504-141100-89-05-168110)。
- 二、建设地址及线路走向: 山西省吕梁市岚县。线路始于岚县岚城镇阳湾村拟建的华电岚县光伏发电项目 220KV 变电站,止于岚县上明乡阳坡村旭东升风电项目~铜鼓山光伏项目 220KV 送出线路,途径岚县岚城镇、东村镇、上明乡境内。
- 三、主要建设规模及内容:新建 220kV 架空线路长度 13.66 千米,其中新建同塔双回线路架空线路长度 13.04 千米,新建单 回架空线线路长度 0.62 千米。导线采用 2×JL/G1A-300/40 钢芯 铝绞线导线(垂直双分裂排列),地线采用 2 根 48 芯 0PGW 复合 通信光缆。新建铁塔 34 基,其中新建双回铁塔 32 基,单回铁塔 2 基。

四、总投资及资金来源:项目总投资 5486 万元,全部由项目单位自筹解决。

五、建设工期: 6个月。

六、按照相关法律、行政法规的规定,核准项目的支持文件是: 山西省能源局《关于下达山西省 2023 年风电、光伏发电保障性并网年度建设计划的通知》(晋能源新能源发 (2023) 292 号)、吕梁市重大决策社会稳定风险评估备案意见(吕稳评备 (2025) 1号)、吕梁市规划和自然资源局《关于华电岚县光伏发电项目送出线路用地预审与选址意见书》(电子监管号

1411002025XS0009528)、华电岚县光伏发电项目备案证。

七、项目所需设备采购及建设施工等招标事项应按照《中华 人民共和国招标投标法》和《山西省工程建设项目招标投标条例》 等有关规定,严格执行批复的招标方案。

八、项目单位在项目开工建设前,应依据相关法律、行政法规规定,并根据项目实际涉及情况办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评、节能、取水等相关报建手续。未完成报建手续的,项目不得开工建设。项目单位要从严控制建设用地规模,做到节约集约用地,不得超标准用地;项目工程设计、建设及运行要满足国家环保标准和要求,采取有效措施降低能耗、提高效率;要落实安全生产主体责任,严格遵守安全生产有关法律法规和规程规范,落实安全评价制度,做好"三同时",落实安全生产措施,保证项目建设和生产期间安全生产。

九、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整变更 请按照有关规定,及时提出书面变更申请。我局将根据项目具体 情况,作出是否同意变更的书面决定。

十、项目自本文件印发之日起2年未开工建设,需要延期开工建设的,企业应当在2年限期届满的30个工作日前,按规定向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次,期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的,依照其规定执行。在2年期限内未开工建设也未按照规定申请延期,或者在同意延期的期限内未开工建设的,本核准文件自动失效。

-3 -

十一、按照《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》等规定,企业应当通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、资金使用、竣工等基本信息。

附件: 吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表 2025-023 号



(此件主动公开)

抄送: 吕梁市发展和改革委员会、吕梁市能源局, 岚县能源局。

吕梁市行政审批服务管理局

2025年4月22日印发

-4-

吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表

项担代码: 2804-141100-89-05-168110

核准号: 2025--023

项目名称	华电鬼县光状发电项目送出线路				建设单位	以县华电新能源有限贵任公		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式	
	全部招标	部分招标	娄托招标	自行招标	公开招标	邀请招标		
勘察	_					_	核准	
投计				_	_		核准	
建安工程	校准		核准		核准			
监理				_		-	核准 —	
设备								
材料 —		_ _					_	
お标次	告发布媒体	山珊栽	7.投标网(ht1	n://www.sxhi	d com cn)			

核准意见:

- 一、该项目属于关系社会公共利益、公众安全的能源基础设施项目,根据有关规定,达到强 制招标规模标准的各项建设内容均应进行招标。
- 二、同意建设单位提出的建安内容全部委托招标代理机构公开招标的申请。同意建设单位提出的勘察、设计、监理内容不采用招标方式的申请。
 - 三、该项目的招标公告和公示信息应在山西省招标投标公共服务平台上发布。
 - 四、该项目应在山西省评标专家库抽取评标专家。
 - 五、该项目应在招标公告发布30日前公开发布招标计划。

吕梁市行政审批服务管理局文件

吕审批发[2025]244 号

吕梁市行政审批服务管理局 关于华电岚县光伏发电项目 220kV 送出工程 环境影响报告表的批复

岚县华电新能源有限责任公司:

你公司报送的《关于华电岚县光伏发电项目 220kV 送出工程环境影响报告表报批申请》(岚县华电函〔2025〕10号)及相关材料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定,以及山西明宇环境科技工程有限公司出具的《华电岚县光伏发电项目 220kV 送出工程环境影响报告表的评估报告》(以下简称《评估报告》)(明宇咨〔2025〕023号),经研究,批复如下:

-1 -



一、华电岚县光伏发电项目 220kV 送出工程始于岚县岚城镇阳湾村拟建的华电岚县光伏发电项目 220kV 升压站,止于岚县上明乡阳坡村旭东升风电项目~铜鼓山光伏项目 220kV 送出线路,途经吕梁市岚县岚城镇、东村镇、上明乡境内。主要建设内容包括新建 220kV 架空线路长度 13.66km,其中同塔双回架空线路13.04km,单回路架空线路 0.62km。新建铁塔 34 基,其中新建双回铁塔 32 基,单回铁塔 2 基。该项目总投资 5486 万元,其中环保投资 83.26 万元,占工程总投资的 1.52%。

该项目经吕梁市行政审批服务管理局予以核准,项目代码: 2407-141100-89-05-168110,符合国家产业政策。依据山西明宇环境科技工程有限公司《评估报告》(明宇咨[2024]023号),在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施后,不利影响能够得到一定的有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作:

(一)严格落实施工期生态保护和恢复措施。注意对熟化土壤的保护和利用,施工前,先把表层的熟化土壤推到合适的地方并集中起来;待施工结束后,再施用到要进行植被建设的地段,使其得到充分、有效地利用。在进行植被恢复与重建过程中,要选择适应于当地生长的土著植物,提高植被覆盖率,有助于重建植被的完整性与原生植被的统一性,对临时占用的旱地进行原地复耕。

-2 -



- (二)强化施工期大气污染防治措施。加强施工现场管理, 严格做好土方、运输车辆的遮盖以及道路洒水等抑尘措施。建筑 工地必须做到"6个100%"扬尘防治要求。
- (三)落实水污染防治措施。严格执行《建设工程施工工地 文明施工及环境管理暂行规定》,对施工废水进行妥善处理。施工 废水经沉淀池沉淀后,全部回用于洒水降尘。施工人员就近租用 民房,生活污水依托当地已有的生活污水处理设施进行处理。
- (四)落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间,做到文明施工,采取有效措施,严格控制施工噪声对周围环境的影响。 选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电等措施来降低线路运行对周围声环境的影响,确保线路运行期间线路沿线声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求。
- (五)加强固体废物污染防治措施。做好施工期土石方平衡, 弃土弃渣应合理处置,不得沿坡倾倒,污染环境。施工过程中的 建筑垃圾采用分类收集,可回用的统一收集回用,不能回用的收 集后统一清运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员生活垃圾收集 后送环卫部门指定地点集中处置。确保固体废物均合理处置。
- (六)严格落实防治工频电场、工频磁场等环境保护措施。 输电线路合理布置,通过提高导线对地高度,优化导线相间距离 以及导线布置,降低输电线路对周围电磁环境的影响,确保线路 沿线工频电磁场强度水平符合标准。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任,建立内部生态环

-3 -



境管理机构和制度,明确机构、人员、职责和制度,加强生态环境管理,推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程"同时设计、同时施工、同时投产"的环境保护"三同时"制度。项目建成后,应按规定程序开展竣工环境保护验收工作。

四、项目开工前须依法依规办理用地相关审批手续,确保项目用地选址合法合规。建设场地须满足土地、规划等方面的要求。

五、吕梁市生态环境局、吕梁市生态环境局岚县分局,按照 各自职责负责该项目"三同时"监督检查及日常管理工作。

六、你公司收到本批复后 10 个工作日内,要将批准后的环境影响报告表分送吕梁市生态环境局、吕梁市生态环境局岚县分局,并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。



(此件主动公开)

抄送: 吕梁市生态环境局、吕梁市生态环境局岚县分局。

吕梁市行政审批服务管理局

2025年6月24日印发

— 4 **—**





报告编号: ZYJC2509029

检验检测报告

项目名称: __华电岚县光伏发电项目送出线路__

项目竣工环境保护验收监测

检测类别: _____ 委 托 检 测

光服用 4

山西志源生态环境科技有限公司 报告日期:2025年10月20日

注意事项

- 1. 有下列情形之一,本检验检测报告无效。
 - (1) 检验检测依据超出资质认定能力范围的报告;
 - (2) 无加盖公司"检验检测专用章"和"CMA标志章";
 - (3) 多页报告未盖骑缝章:
 - (4) 报告复印未重新加盖检测机构"检验检测专用章";
 - (5) 无检测、审核、批准人签名报告:
 - (6) 非授权签字人签发或批准的检验检测报告:
 - (7) 报告内容涂改或部分复印。
- 2. 本报告仅对本次检验检测项目负责。
- 3. 本报告上的检测结果和检验检测机构名称,未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商业宣传等。
- 4. 委托方如对报告存有异议,请于收到报告 15 日内以书面 形式向本机构提出,逾期不予受理。

检验检测机构名称: 山西志源生态环境科技有限公司 检验检测机构地址: 山西省太原市万柏林区漪汾街 26 号 麦特摩尔大厦 3 幢 10 层 1008 号

联系电话/传真: 0351-5251088 邮政编码: 030024





检验检测机构资质认定证书

证书编号: 230412050171

名称:山西志源生态环境科技有限公司

地址:山西省太原市万柏林区漪汾街 26 号麦特摩尔大厦 3 幢 10 层 1008 号

经审查, 你机构已具备国家有关法律员行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出户具有证明企用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构力量认证。检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



发证日期: 2023年07月21日

有效期至: 2029年07月20日

发证机关: 山西省市场监督管理局

提示: 1. 应在法人资格证书有效期内开展工作。2. 应在证书有效期届满前3个月提出复查申请,逾期不申请此证书注销。 本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

山西志源生态环境科技有限公司 检验检测报告

报告编号: ZYJC2509029

第1页共6页

项目名称	华电岚县光伏发电项目送出线路项目竣工环境保护验收监测										
受测单位	岚县华电新能 源有限责任公司			单位	地址		山西省吕梁市岚县经济技术 发区铸造产业园办公楼 1007				
委托单位	岚县华电新能 源有限责任公司			检测	地点		吕梁市岚县				
检测类型	- 2		检测	日期	2	2025年9月26日					
检测依据		HJ681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》; GB3096-2008《声环境质量标准》附录C。									
检测项目	工频电场	工频电场强度、工频磁感应强度、功能区噪声									
主要检测	仪器名称: 电磁辐射分析仪 (含工频探头) 型号: SEM-600/LF-0设备编号: ZYYQ-JC-11 检定/校准证书编号: 24J02X102226检定/校准有效期: 2024年11月1日至2025年10月31日仪器性能: 1Hz-400kHz								2226		
仪器设备	设备编号 检定/校准	仪器名称: 多功能声级计 规格型号: AWA6292 设备编号: ZYYQ-JC-09 检定/校准证书编号: XZJS-20241150084 检定/校准有效期: 2024年11月1日至2025年10月31日仪器性能: 35dB~130dB(A)									
检测结论		/									
	时间	天气 状况	温度 (°C)		湿度 (% RH) (kP			风速 (m/s)	风向		
检测环境	昼间	晴	24	4	6	87.2		1.3	西		
	夜间	多云	12	4	7	87.5		1.4	西北		
批准人	曹军教	至 2015年	10月20日	目 审核人 展现 2015年10月20日					0月10日		
主检人	郑灵曦 王江伟 7005年/0月20						0月 20日				
备注	本次检测依据《华电岚县光伏发电项目送出线路项目竣工环境保护验收监测方案》。送出线路运行工况为229.68kV、236.78A。										
录入	李璞	李璞 校 对 郑晨曦 打印日期 2025年10月20日									





检验检测报告(续页)

报告编号: ZYJC2509029

第2页共6页

序号	检测点位描述	检测项目	单位	检测结果	标准值	单项判定
1	线路 SG7~SG8 段跨越	工频电场强度	V/m	501.0	/	1
1	220kV 第岚线	工频磁感应强度	μТ	0.8863	1	/
2	线路 SG16~SG17 段跨越	工频电场强度	V/m	180.2	/	7
2	G337 过道(黄榆线)处	工频磁感应强度	μТ	0.5621	/	1
3	线路 SG29~SG30 段跨越	工频电场强度	V/m	589.4	/	1
3	110kV 高岚线处	工频磁感应强度	μТ	0.6733	/	1
4	₩ ap _ 1÷ ₩	工频电场强度	V/m	892.1	1	1
4	线路π接处	工频磁感应强度	μТ	0.5167	1	1
5	G18~G19 塔间线路弧垂	工频电场强度	V/m	995.5	1	1
3	最低处中导线下 0 米	工频磁感应强度	μТ	0.7527	/ / / /	1
6	G18~G19 塔间线路弧垂	工频电场强度	V/m	883.5	/	1
6	最低处中导线外 5 米	工频磁感应强度	μТ	0.7094		/
7	G18~G19 塔间线路弧垂	工频电场强度	V/m	723.8	/	/
/	最低处中导线外 10 米	工频磁感应强度	μТ	0.6071	/ / / / / / / / / / / /	/
8	G18~G19 塔间线路弧垂	工频电场强度	V/m	446.9	/	1
8	最低处中导线外 15 米	工频磁感应强度	μТ	0.5027	1	/
9	G18~G19 塔间线路弧垂	工频电场强度	V/m	317.2	/	/
9	最低处中导线外 20 米	工频磁感应强度	μТ	0.4524	/	/
10	G18~G19 塔间线路弧垂	工频电场强度	V/m	216.8	/	/
10	最低处中导线外 25 米	工频磁感应强度	μТ	0.3957	/	/
11	G18~G19 塔间线路弧垂	工频电场强度	V/m	116.7	/	/
11	最低处中导线外 30 米	工频磁感应强度	μТ	0.3436	/	/

检验检测报告(续页)

报告编号: ZYJC2509029

第3页共6页

序号	检测点位描述	检测项目	单位	检测结果	标准值	单项判定
12	G18~G19 塔间线路弧垂 最低处中导线外 35 米	工频电场强度	V/m	60.87	1	1
		工频磁感应强度	μТ	0.2949	1	1
13	G18~G19 塔间线路弧垂 最低处中导线外 40 米	工频电场强度	V/m	20.35	1	/
		工频磁感应强度	μТ	0.2421	1	1
14	G18~G19 塔间线路弧垂 最低处中导线外 45 米	工频电场强度	V/m	10.84	1	1
14		工频磁感应强度	μТ	0.2080	1	/
15	G18~G19 塔间线路弧垂	工频电场强度	V/m	8.587	/	1
13	最低处中导线外 50 米	工频磁感应强度	μТ	0.1459	/	1
	以下空白					
				- ×		

检验检测报告(续页)

报告编号: ZYJC2509029

第4页共6页

序号	检测点位 描述	检测时间	单位		标准	单项			
				Leq	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	值	判定
1	线路 SG7~SG8 段 跨越 220kV 第岚线	昼间 (11:32)	dB(A)	42.7	44.2	42.4	41.1	/	/
		夜间 (22:04)	dB(A)	39.9	41.5	38.4	37.5	/	/
	线路 SG16~SG17 段跨越 G337 过道 (黄榆线) 处	昼间 (12:13)	dB(A)	44.6	46.5	43.9	42.5	/	/
2		夜间 (22:43)	dB(A)	40.8	42.3	40.4	38.1	/	/
2	线路 SG29~SG30 段跨越 110kV 高岚 线处	昼间 (15:15)	dB(A)	42.0	43.9	41.3	40.1	/	/
3		夜间 (23:09)	dB(A)	39.6	41.2	38.8	37.8	/	/
4	线路π接处	昼间 (16:00)	dB(A)	42.3	43.8	41.6	40.6	/	1
4		夜间 (23:55)	dB(A)	39.3	40.1	38.8	38.2	1	1
	以下空白								
				-					
						,			
								1	

第 47 页

检验检测报告 (续页)

报告编号: ZYJC2509029

第6页共6页




******报告结束*****




附图 1 项目地理位置图


附图 2 线路路径图



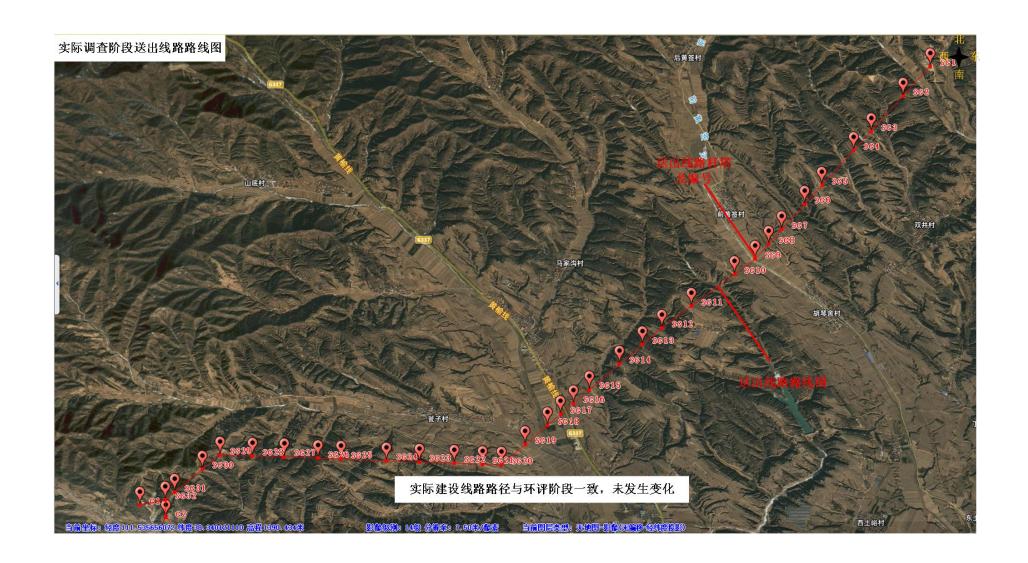


附图 3 施工布置和生态保护措施分布图

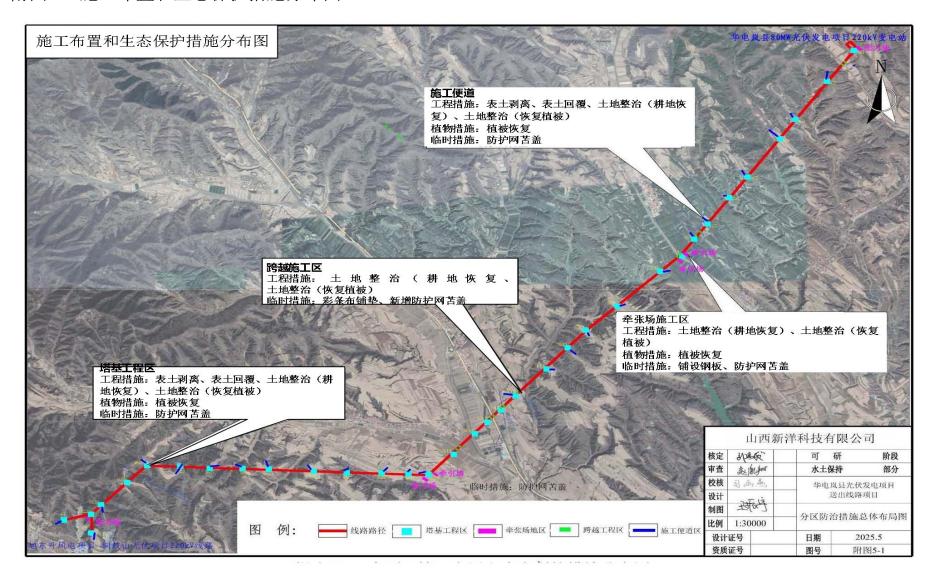

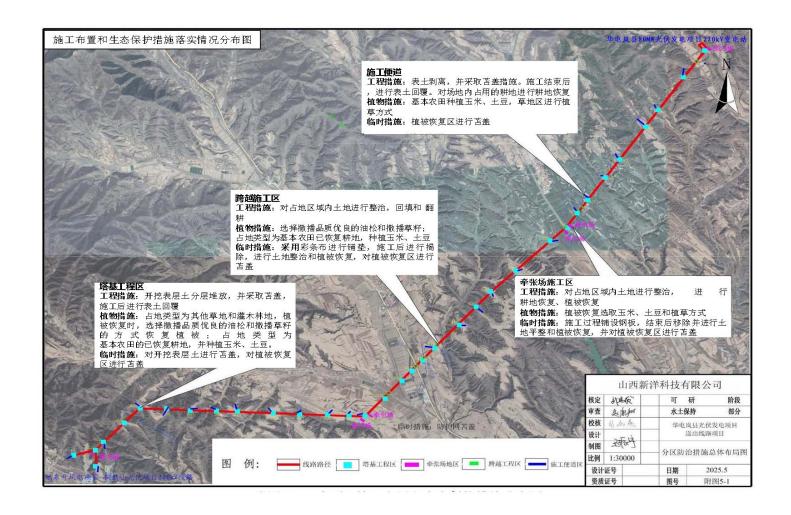

附图 5 现场照片

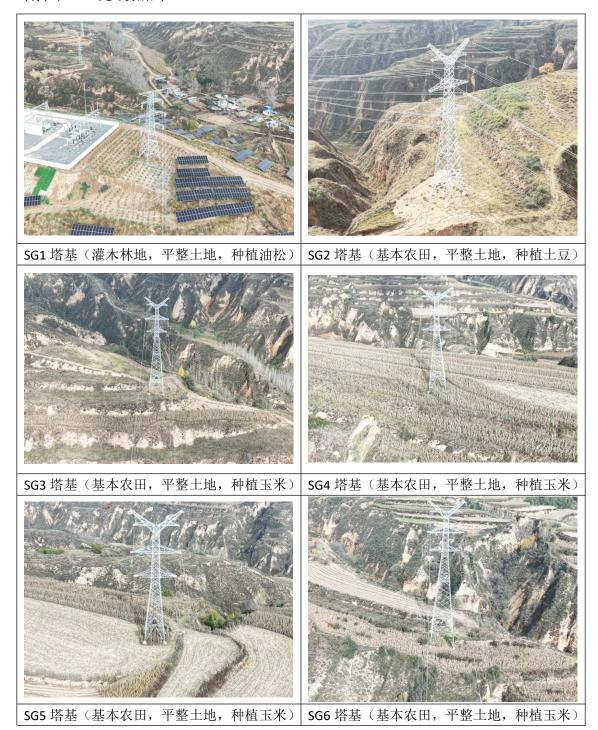




SG7 塔基(基本农田, 平整土地, 种植玉米)



SG8 塔基(基本农田,平整土地,种植玉米)



SG9 塔基(跨越黄签河,基本农田,平整土 地,种植玉米)



SG10 塔基(基本农田, 平整土地, 种植玉米)



SG11(基本农田, 平整土地, 种植玉米)



SG12 塔基(基本农田, 平整土地, 种植玉米)



SG13 塔基(其他草地,平整土地,种草绿化)

SG14 塔基(基本农田, 平整土地, 种植玉米)



SG15 塔基(基本农田, 平整土地, 种植玉米)



SG16 塔基(跨越 G337 国道,基本农田,平 整土地,种植玉米)





SG17 塔基(基本农田,平整土地,种植土豆) SG18 塔基(基本农田,平整土地,种植土豆)



SG19 塔基(基本农田,平整土地,种植玉米)

SG20 塔基(基本农田, 平整土地, 种植玉米)





SG21 塔基(基本农田,平整土地,种植玉米)

SG22 塔基(基本农田,平整土地,种植玉米)





SG23 塔基(基本农田,平整土地,种植玉米) SG24 塔基(基本农田,平整土地,种植玉米)



SG25 塔基(基本农田, 平整土地, 种植玉米)



SG26 塔基(基本农田,平整土地,种植土豆)




SG27 塔基(基本农田,平整土地,种植玉米)



SG28 塔基(基本农田,平整土地,种植玉米)



SG29 塔基(基本农田,平整土地,种植玉米)



SG30 塔基(基本农田,平整土地,种植玉米)



SG31 塔基(基本农田,平整土地,种植玉米) SG32 塔基(基本农田,平整土地,种植土豆)







SG33 塔基(基本农田,平整土地,种植土豆)

SG34 塔基(基本农田, 平整土地, 种植土豆)





G1 塔基(基本农田, 平整土地, 种植玉米)

G2 塔基(基本农田, 平整土地, 种植土豆)






植被恢复(种植油松)





施工便道平整及植被恢复

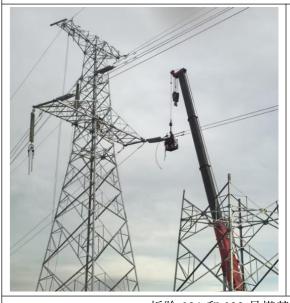



拆除 031 和 032 号塔基, 新建 G1 和 G2 塔基
